


Zeist, 10 juni 2026

Beste omwonende, ondernemer en/of belangstellende,

Graag geven wij u een nieuwe update van de werkzaamheden van het voormalige V&D pand in Zeist.

In de afgelopen 2 weken hebben we de helft van de nieuwe keldervloer gestort.

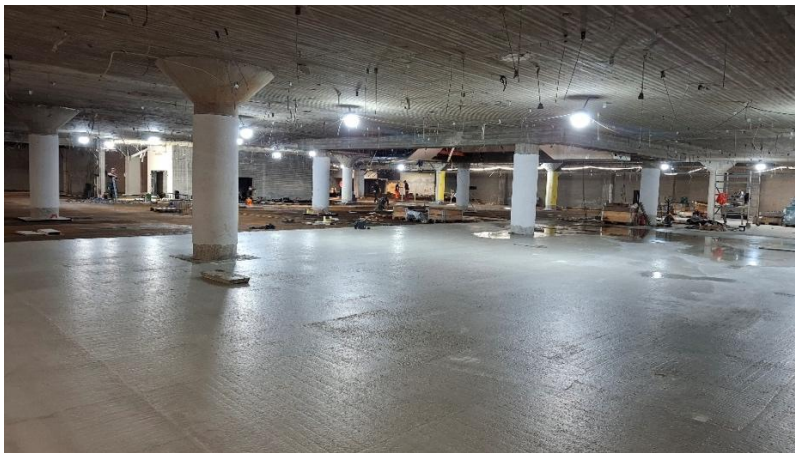

Het resterende deel van de keldervloer brengen we op 15 en 22 juni aan. Voor deze stortmomenten moeten we de betonpomp aan de achterzijde van de voormalige V&D plaatsen i.v.m. de afstand van de slangen.

Op de bouwplaats aan de voorzijde wachten de betonmixers totdat ze, onder begeleiding van een verkeersbegeleider, via de Meester de Klerkstraat naar de betonpomp aan de achterzijde rijden. Dit zal mogelijk hoorbaar zijn en verkeersbewegingen aan de Meester de Klerkstraat geven.

De 2 nog te storten delen van de vloer zijn groter dan de nu uitgevoerde delen, waardoor we meer tijd nodig hebben om dit uit te voeren. Op 15 en 22 juni a.s. starten we rond 06.00 uur en verwachten we rond 21.00 uur gereed te zijn.

Vervolgens verwachten we op 25 juni 2026 te kunnen starten met de sloop van het totale pand.

Zijn er vragen over de bouwwerkzaamheden of ervaart u overlast (geen vragen over verhuur) dan kan u contact opnemen met zeist@akor.nl.

Wij wensen u een fijne dag,

Bouwteam Zeist
